



RAPORT DE VIZITA SANTIER - REABILITAREA SI EXTINDEREA STATIEI DE EPURARE TARGOVISTE SUD

Intocmit in urma vizitei efectuate in data de 15.07.2013 de Avramescu Sorin in calitate de membru al serviciului extern de prevenire si protectie in munca

Vizitele au fost efectuate in toate zonele de lucru din cadrul santierului.

In urma vizitei au fost constatate urmatoarele neconformitati:

Nr. Crt.	Elementul analizat	Observatii/masuri/termene
1.		Observatie : In santier sunt desfasurate activitati fara purtarea echipamentului individual de protectie minim (casca de protectie, bocanci, salopeta). Masura : Este obligatorie purtarea echipamentului individual de protectie in santier atat pentru personalul ce desfasoara activitati cat si pentru persoanele ce viziteaza santierul. Termen: Permanent, 22.07.2013 Responsabil: Coordonator santier / Executant / Subcontractori / Conducatorii locurilor de munca. Coordonator santier in materie de SSM




city square safety management





2.

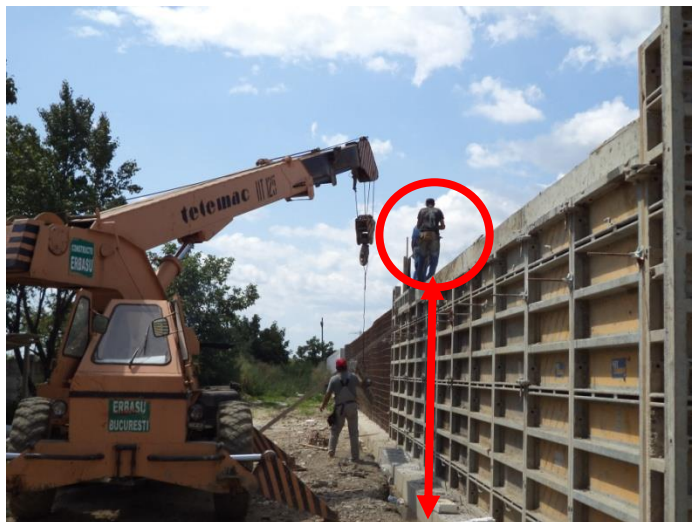

Observatie : Desfasurarea activitatilor la inaltime fara utilizarea echipamentului individual de protectie (centura/hamuri/legaturi) si asigurarea acestora.

Masura : Efectuarea lucrarilor la inaltime se va realiza doar prin purtarea echipamentului individual de protectie (centura/hamuri/legaturi). Asigurarea echipamentului de lucru la inaltime este obligatorie.

Termen: Permanent, 22.07.2013


Responsabil: Coordonator santier / Executant / Subcontractori / Conducatorii locurilor de munca.



city square safety management



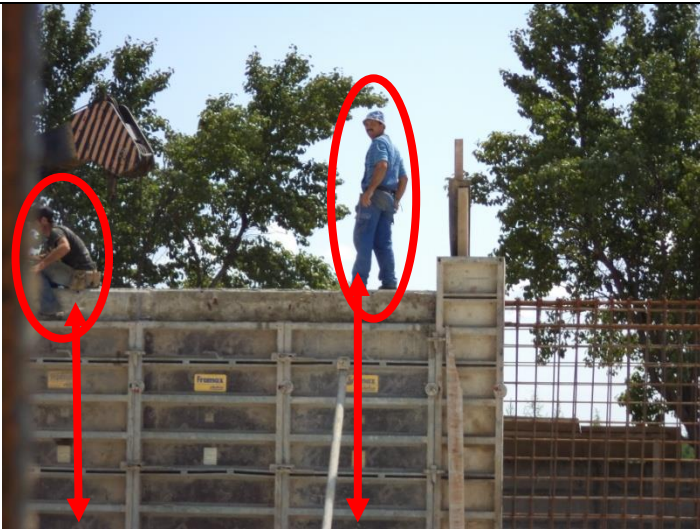

		
3.	 	Observatie : Zone in care mana curenta si/sau balustrada lipsesc pentru scarile de acces din interiorul cladirilor. Masura : Scarile de interior vor avea obligatoriu montate balustrade sau mana curenta. Termen: 22.07.2013 Responsabil: Subcontractori / Conducatorii locurilor de munca.



4.



Observatie : Dispozitive de alimentare cu energie electrica improvizate. Risc de electrocutare pentru lucratorii ce folosesc astfel de echipamente electrice.

Masura: Este interzisa utilizarea oricaror echipamente electrice improvizate in santier. Cablurile electrice ce prezinta deteriorari vor fi inlocuite.

Termen: 22.07.2013

Responsabil: Executant / Subcontractori/
Conducatorii locurilor de munca / Coordonator
santier



5.



Observatie : Mijloace necorespunzatoare de circulatie si deplasare deasupra golurilor tehnologice.

Masura: In santier toate caile de circulatie si deplasare utilizate pentru deplasarea sau efectuarea unor lucrari deasupra goluri tehnologice, se vor constitui tinand cont de stabilitatea mijloacelor utilizate. Nu trebuie sa lipseasca mana curenta la podine si pasarele, suprafetele de sprijin, ancorarea fata de constructiile pe care le deservesc.

Termen: Permanent; 22.07.2013

Responsabil: Executant / Subcontractori / Conducatorii locurilor de munca.



6.



Observatie: Scari improvizate si care nu respecta dimensiunile de constructie necesare lucrarilor pentru care sunt utilizate.

Masura: In santier se vor utiliza doar scari ce corespund din punct de vedere al dimensiunilor de constructie. Scarile trebuiesc montate corespunzator, respectand stabilitatea la sol, unghiul de inclinare, inaltimea la care se va urca (80 cm peste marginea de acces).

Termen: 22.07.2013/Permanent

Responsabil: Lucratori/Subcontractori/Conducatorii locurilor de munca



7.



Observatie: Zonele excavate ce prezinta pericol de cadere nu sunt semnalizate perimetral.

Masura: Toate golurile tehnologice si zonele ce prezinta pericol de cadere vor fi imprejmuite corespunzator cu banda de semnalizare, conform cerintelor HG 971/2006.


Termen: Permanent, 22.07.2013

Responsabil: Executant/Subcontractori/Conducatori ai locurilor de munca



8.		Observatie : Cablurile de alimentare cu energie electrica sunt lasate pe caile de circulatie mixte, fiind expuse la deteriorarile mecanice si reprezentand un pericol pentru lucratorii ce isi desfasoara activitatea in santier. Masura : Se vor indeparta toate cablurile de alimentare cu energie electrica, de pe caile de circulatie mixte unde desfasoara activitati de lucru si utilajele din santier, prin suspendarea sau postarea lor pe suporturi. Termen: Permanent, 22.07.2013 Responsabil: Executant /Subcontractori /Conducatorii locurilor de munca /Coordonator in

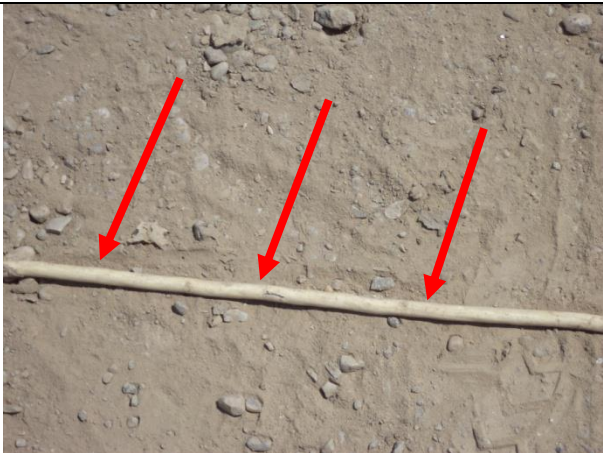

		materie de SSM
9.		Observatie : Buteliile utilizate in procesele de munca sunt pozitionate la nivelul solului si nu sunt prevazute cu inele cauciucate pentru protectie impotriva ciocnirii, caderii, lovirii si altor actiuni ce pot conduce la deteriorarea sau explozia acestora. Masura : Toate buteliile din santier vor fi prevazute cu inele de cauciuc pentru protectie si vor fi pozitionate doar vertical. Termen: 22.07.2013 Responsabil: Executant / Subcontractori /Conducatorii locurilor de munca





10.



Observatie : (1) Sufele, organele de legare utilizate pentru ridicari de sarcina sunt deteriorate.

(2) Sufele, organele de legare si dispozitivele de prindere utilizate pentru ridicari de sarcina nu sunt intretinute in mod corespunzator. Aceasta actiune conducand la deteriorarea mecanica a acestora.

Masura: (1) Este interzisa utilizarea organelor de prindere si legare utilizate pentru ridicarea sarcinilor daca acestea sunt deteriorate. Riscul de rupere este foarte ridicat.

(2) Toate mijloacele de legatura vor fi depozitate si intretinute corespunzator. Abandonarea acestora pe santier este strict interzisa!

Termen: 22.07.2013

Responsabil: Executant (legator sarcina) / Subcontractori/ Conducatorii locurilor de munca



11.



Observatie : Zone de acces la inaltime din exteriorul cladirilor la care mana curenta si/sau balustrada lipsesc (pentru accesul la bazinele tehnologice).

Masura : Toate zonele de acces la inaltime vor fi obligatoriu prevazute cu balustrade continue sau mana curenta. Toate zonele in care aceste dispozitive lipsesc vor fi semnalizate corespunzator pentru a nu supune lucratorii la risc de cadere de la inaltime.


Termen: 22.07.2013

Responsabil: Subcontractori / Conducatorii locurilor de munca.



12.		Observatie : Abandonarea echipamentelor de lucru electrice pe santierul de constructii. Masura : Dupa finalizarea procesului de munca, lucratorii vor strange echipamentele si uneltele folosite si le vor depozita corespunzator. Termen: Permanent / 22.07.2013 Responsabil: Executant /Subcontractori /Conducatorii locurilor de munca
13.		Observatie : Golurile tehnologice din santier nu sunt acoperite si nici semnalizate corespunzator. Masura : Toate golurile tehnologice din santier ce prezinta pericol de cadere vor fi acoperite sau imprejmuite corespunzator. Termen: 22.07.2013 Responsabil: Executant /Subcontractori /Conducatorii locurilor de munca

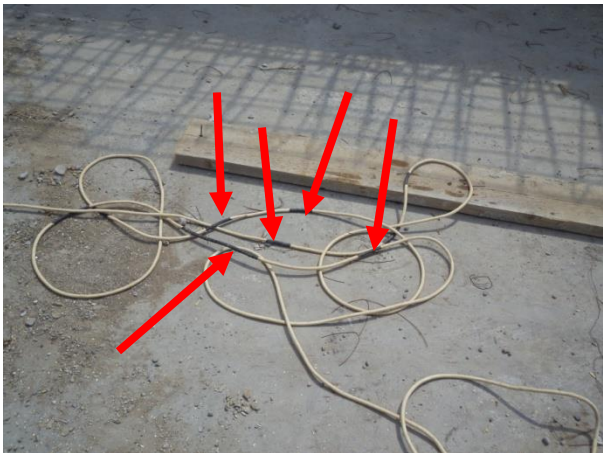

		
14.		Observatie: Cabluri de alimentare sectionate care au fost lipite prin improvizatii si izolate cu banda adeziva. Masura: Este interzisa utilizarea unor improvizatii la cablurile de alimentare a echipamentelor electrice din santier. Se vor suspenda toate cablurile aflate pe caile de circulatie mixte. Termen: Permanent / 22.07.2013 Responsabil: Antreprenor general/Subcontractori/ Conducatorii locurilor de munca



15.



Observatie : (1) Suspendarea necorespunzatoare a cablurilor de alimentare cu energie electrica.

(2) Circulatia pe sub cabluri nu este supravegheata de catre un alt operator de la sol.

Masura: (1) Cablurile de alimentare vor fi astfel suspendate incat sa nu intre in contact cu utilajele din santier.

(2) Circulatia utilajelor in zonele in care sunt prezente cabluri suspendate va fi mereu dirijata de catre un alt operator de la sol.

Termen: Permanent, 22.07.2013

Responsabil: Subcontractori/ Conducatorii locurilor de munca / Coordonator santier



16.		Observatie : Tablouri de alimentare cu energie electrica necorespunzatoare si accesibile oricui. Masura: Vor fi utilizate doar tablouri de alimentare cu energie electrica conforme, care sa nu puna in pericol viata lucratorului ce intra in contact cu acestea. Accesul la tablourile de alimentare cu energie electrica va fi permis doar lucratorilor autorizati si care au fost instruiti in acest domeniu. Termen: Permanent, 22.07.2013 Responsabil: Subcontractori/ Conducatorii locurilor de munca / Coordonator santier
17.		Observatie : Suspendarea incorecta a dispozitivelor tubulare, pe mijloace improvizate ce nu prezinta stabilitate. Masura: Toate conductele, dispozitivele tubulare ce necesita a fi suspendate, vor fi pozitionate pe suporti corespunzatori si bine fixati. Termen: Permanent, 22.07.2013 Responsabil: Subcontractori/ Conducatorii locurilor de munca / Coordonator santier



		
18.		Conformitate: Mijloace de acces la inaltime corespunzatoare, prevazute cu balustrade continue si mana curenta.



**city square safety
management**
